

Акт
приемки выполненных работ по огнезащитной
поверхностной пропитке деревянных конструкций

« 30 » октября 2024 г.

с.Бадам

Комиссия, в составе:

Заказчик – Директор ТОО «Ясли-сад «Ұлы-Орда»» Татпенова А.А.

Исполнитель – Директор ТОО «FIRE STOP» Торекулова У.О.

Произвели проверку качества проведенных огнезащитных работ, по огнезащитной пропитке деревянных конструкции здания ТОО «Ясли-сад «Ұлы-Орда» расположенного по адресу РК, Туркестанская область, Ордабасинский район, с/о.Бадамский, село Бадам, мкр.Орда, здание 326/1 и сделали следующие заключения:

- огнезащитный пропиточный состав наносился на деревянные конструкции общей площадью **383,4 м²**. влажность обработанных деревянных конструкции составляет 15 %.
- метод поверхностной пропитки заключался в нанесении распылением пропиточного состава на конструкции.
- расход состава составляет 0,5л на 1 м².
Состав пропиточного раствора «ПОСТ-Био-1»
Массовая доля основного вещества - 99,6 %
Массовая доля воды – 0,2 %
Массовая доля свободной серной кислоты – 0,05 %
Массовая доля железа – 0,03 %
Массовая доля кальция – 0,01 %
Массовая доля нерастворимых примесей - 0,08%

Проверка на огнезащищённость деревянных конструкции:
были отобраны три пропиточного образца древесины и проведены испытания. В результате испытания было установлено, что огнезащитная пропитка соответствует ГОСТ 16363-98

Комиссия:

Заказчик _____

Татпенова А.А.

Исполнитель _____

Торекулова У.О.



АКТ
перезарядки огнетушителей

«30» ноября 2024 г.

с.Бадам

Комиссия, в составе:

Заказчик – Заведующая «ТОО «Ясли-сад «Ұлы-Орда» Татпенова А.А.

Исполнитель – Директор ТОО «FIRE STOP» Торекулова У.О.

Марка - ОП-5

Количество огнетушителей – 5 штук.

При осуществлении перезарядки:

Корпус огнетушителя полностью очищен от остатков огнетушащего вещества (ОВ), произведен внешний и внутренний осмотр, а также гидравлическое испытание на прочность и пневматические испытания на герметичность корпуса огнетушителя, пусковой головки, шланга и запорного устройства, а также после успешного завершения испытания просушен и заряжен огнетушащим веществом (ОВ).

Результаты проведения перезарядки огнетушителей занесены на бирки.

Комиссия:

Заказчик:



Татпенова А.А.



Торекулова У.О.

Акт
приемки работ по чистке вентканалов вентиляционной системы

«31» октября 2024 г.

г.Шымкент

Комиссия в составе:

Заведующая «Ясли-сад «Ұлы-Орда» Татпенова А.А.

Директор ТОО «FIRE STOP» Торекулова У.О.

Составила настоящий акт о том, что в период с 28 октября по 31 октября 2024 года произведена наружная и внутренняя очистка воздуховодов, пылеуловителей, фильтров и вентиляционного оборудования системы вентиляции от пыли и пожароопасных отложений в здании **ТОО «Ясли-сад «Ұлы-Орда»** расположенного по адресу РК, Туркестанская область, Ордабасинский район, с/о.Бадамский, село Бадам, мкр.Орда, здание 326/1.

Заключение комиссии:

Указанная система вентиляции и вентиляционное оборудование находится в чистом состоянии.

Комиссия:

	Татпенова А.А.
	<u>Торекулова У.О.</u>

АКТ

обслуживания автоматической пожарной сигнализации

«30» октября 2024 г.

с.Бадам

Комиссия, в составе:

Заказчик – Заведующая «Ясли-сад «Ұлы-Орда» Татпенова А.А.

Исполнитель - Директор ТОО «FIRE STOP» Торекулова У.О.

Основание: договор на техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации №192-16/10 от «16» октября 2024 г.

Произвели ревизию шлейфов, проверку на работоспособность пожарных извещателей, приборов, оповещателей систем автоматической пожарной сигнализации установленной в здании ТОО «Ясли-сад «Ұлы-Орда» расположенного по адресу РК, Туркестанская область, Ордабасинский район, с/о.Бадамский, село Бадам, мкр.Орда, здание 326/1.

Неисправности устранены, автоматическая пожарная сигнализация в исправном состоянии.

Комиссия:

Заказчик:

Татпенова А.А.

Исполнитель

Торекулова У.О.





СОГЛАСОВАНО

Заведующая ТОО «Ясли сад Ұлы Орда»

Татпенова А.А.

« 29 » 10 2024 г.



СОГЛАСОВАНО

Директор ТОО «FIRE STOP»

Торекулова У.О.

« 29 » 10 2024 г.

ГРАФИК

Технического обслуживания автоматической пожарной сигнализации
на 2024-2025 год

п/п	Наименование объекта	Срок проведения работ			
		с 25.10.2024 г. по 29.10.2024 г.	с 21.02.2025 г. по 25.02.2025 г.	с 23.05.2025 г. по 27.05.20245г.	с 26.08.2025 г. по 29.08.2025 г.
1.	ТОО «Ясли сад Ұлы Орда»				

Примечание: Все работы по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации проводятся согласно регламента работ по обслуживанию.

ДОГОВОР № 192/16-10

с.Бадам

«16 » октября 2024 года

Товарищество с ограниченной ответственностью «Ясли-сад «Ұлы-Орда», именуемый в дальнейшем - «Заказчик», в лице заведующей Татпеновой А.А., действующей на основании Приказа, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью «FIRESTOP» в лице директора Торекуловой У.О., именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые – Стороны, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, заключили договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.В соответствии с настоящим Договором и на его условиях «Заказчик» поручает «Исполнителю» выполнения работ:

- 1) Техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации (1 год)
- 2) Огнезащитной обработке деревянных конструкции кровли
- 3) Лабораторному испытанию по определению качества проведенных огнезащитных работ
- 4) Обследование и профилактические испытания электрооборудования (замер сопротивления изоляции электропроводки и заземления);
- 5) Перезарядке огнетушителей;
- 6) Акт прочистки системы вентиляции (при наличии);
- 7) Акты испытаний исправности наружных пожарных лестниц в здании ТОО «Ясли-сад «Ұлы-Орда» расположенного по адресу РК, Туркестанская область, Ордабасинский район, с/о.Бадамский, село Бадам, мкр.Орда, здание 326/1.

1.2. «Исполнитель» принимает на себя обязательства выполнить указанные работы, за что «Заказчик» обязуется уплатить «Исполнителю» цену установленную Договором.

2.ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Общая сумма Договора составляет **200 000 (двести тысяч) тенге**, без учета суммы НДС (далее – Сумма Договора).

2.2.Сумма договора является окончательной.

2.3. «Заказчик» оплачивает работы «Исполнителю» в следующем порядке:

В течении 5 (пяти) дней с момента подписания настоящего Договора «Заказчик» производит оплату в размере 100% путем перечисления денежных средств на банковский счет «Исполнителя».

3.СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

3.1. «Исполнитель» обязуется завершить все работы в соответствии со сроком, указанным в данном Договоре.

3.2.В случае нарушения «Заказчиком» сроков оплаты работ, общий срок завершения работ увеличивается на срок задержки оплаты.

3.3.Датой начала выполнения работ по настоящему Договору считается дата получения предоплаты.

3.4.Общий срок проведения работ устанавливается сторонами: в течении года с момента начала работ.

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. «Исполнитель» обязуется:

- 1) За свой риск, своими силами и средствами, из своих материалов осуществить работы, предусмотренные настоящим Договором и сдать результаты работ в течение срока, установленного п.3 настоящего Договора.
- 2) Нести ответственность за своевременное и качественное выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

3) Завершить работы в соответствии с Договором.

4) Обеспечить за свой счет надзор за качеством выполняемых работ, импорт и лицензирование рабочей силы (если таковое будет иметь место), доставку материалов и оборудования, а также всего остального, что связано с выполнением работ.

5) Принять на себя всю ответственность за адекватность и безопасность всех работ в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

6) Соблюдать все требования законодательства Республики Казахстан во всех вопросах, связанных с выполнением работ по настоящему Договору.

4.2. «Исполнитель» вправе:

1) Выдвигать предложения о внесении изменения и дополнений в условия настоящего Договора.

2) Самостоятельно нанимать весь свой персонал и всю рабочую силу, обеспечивать выплату им заработной платы, оплату их проживания, питания и перевозки.

4.3. «Заказчик» обязан:

1) Своевременно предоставить для проведения работ необходимую техническую и строительную документацию на объект, указанный в п. 1.1. настоящего договора, в состоянии, позволяющем своевременно начать работы, нормальное их ведение и завершение в срок.

2) Обеспечить своевременное финансирование работ согласно условиям п. 2.3. статьи 2 настоящего Договора.

4.4. «Заказчик» имеет право:

1) В любое время проверить ход и качество работ, выполняемых «Исполнителем» в соответствии с настоящим Соглашением.

2) За свой счет и на весь период ведения работ, назначить своих представителей. Представители «Заказчика» будут решать с представителями «Исполнителя» все вопросы, возникающие в процессе ведения работ. Заказчик имеет право приглашать для проверки выполнения работ независимого инспектора в период их выполнения.

5. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор может быть расторгнуто:

1) по соглашению сторон;

2) при признании в установленном порядке другой Стороны банкротом;

3) по решению уполномоченных государственных органов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5.2. В случае одностороннего расторжения настоящего Договора расторгающая Сторона должна предупредить об этом другую Сторону не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до момента расторжения настоящего Договора.

5.3. В случае одностороннего расторжения настоящего Договора, «Заказчик» имеет право завершить работы, предусмотренные настоящим Договором, собственными силами или с привлечением любого другого «Исполнителя».

6. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. «Заказчик», получив сообщение «Исполнителя» о готовности к сдаче работ, выполненных по Договору, либо этапа работ, обязан немедленно приступить к приемке их результатов.

6.2. Приемка законченных работ либо ее этапа, осуществляется в течение трех дней после предъявления работ путём подписания сторонами акта выполненных работ.

6.3. Если работы выполнены «Исполнителем» с недостатками «Заказчик» в праве потребовать от «Исполнителя» устранения недостатков в разумный срок.

6.4. Подписанием Акта выполненных работ в полном объёме определяется датой завершения работ.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. «Стороны» освобождаются от ответственности за частичное или полное исполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимых обстоятельств, происходящих на объекте Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся любые события, выходящие за рамки сторон такие, как военные конфликты, стихийные бедствия (пожары, крупные аварии и природные катастрофы) политические решения государства. При наступлении таких обстоятельств, «Стороны» уведомляют друг друга о начале действия указанных обстоятельств путем вручения письменного извещения, уточняющего дату события и описания форс-мажорных обстоятельств, незамедлительно проводят совещания для поиска наиболее оптимального решения в сложившейся ситуации и используют все средства для сведения к минимуму последствий таких обстоятельств. После прекращения форс-мажорных обстоятельств действия договора возобновляется до исполнения «Сторонами» своих обязательств по настоящему Договору.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, будут решаться «Сторонами» путем переговоров.

8.2. Если стороны не могут прийти к соглашению путем переговоров, спорные вопросы должны быть переданы на рассмотрение судебных органов РК в установленном порядке.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору считаются принятыми только после письменного согласования обеими «Сторонами».

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для «Заказчика» и «Исполнителя».

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Заказчик»	«Исполнитель»
ТОО «Ясли-сад «Ұлы-Орда» <u>Юридический адрес:</u> РК, Туркестанская область, Ордабасинский район, с/о.Бадамский, село Бадам, мкр.Орда, здание 326/1. БИН 161040000955 <u>Банковские реквизиты в тенге</u> ИИК KZ10998STB0000877922 БИК TSESKZKA АО «Цеснабанк» в г.Шымкент тел: 8-707-751-82-87	ТОО «FIRE STOP» <u>Юридический адрес:</u> РК, г.Шымкент, мкр.Кайтпас, ул.Наурыз, дом.34. БИН 201040006607 <u>Банковские реквизиты в тенге</u> ИИК KZ0596516F0010343816 БИК IRTYKZKA АО «ForteBank» в г.Шымкент тел: 8(747) 301 28 26, 8(778) 416-48-26;
 Заведующая _____ Татпенова А.А. МП.	 Директор _____ Торекулова У.О. МП.



KZ.T.16.2138

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ТОО «ONTUSTIK KAZ-LENZ»

Аттестат аккредитации № KZ.T.16.2138
от «28» декабря 2023 г.

Протокол испытаний №3478 от 14.11.2024г.

1	Дата проведения испытаний	"13" ноября 2024 года
2	Наименование организации, проводившей испытания	Испытательная лаборатория ТОО "ONTUSTIK KAZ-LENZ", г. Шымкент, ул. Ташенова, 77/25
3	Наименование, адрес и телефон организации – заказчика	ТОО «FIRE STOP», г. Шымкент, мкр. Кайтпас, ул. Наурыз, 34.
4	Основание для проведения испытаний	Заявка №3478 от 12.11.2024 г.
5	Наименование (вид) огнезащитного средства (сведения об изготовителе, товарный знак и маркировка огнезащитного средства)	«ПОС-1», 2-группа огнезащитной эффективности, СТ ДГП 39919819-01-2006, производитель: РГП на ПХВ «Институт проблем горения» г. Алматы ул. Богенбай батыра 172.
6	Наименование нормативной и (или) технической документации	СТ РК 615-1-2011 (часть 1) «Составы вещества огнезащитные», средства огнезащитные для древесины и материалов на ее основе. Общие технические условия
7	Номер партии, дата изготовления	Партия №17-08 от 17.08.24.
8	Наименование и адрес организации проводившей огнезащитную обработку	ТОО «FIRE STOP», г. Шымкент, мкр. Кайтпас, ул. Наурыз, 34.
9	Наименование, адрес и тип конструкции объекта огнезащиты	Деревянные конструкции кровли здания ТОО «Ясли-сад «Ұлы-Орда» расположенного по адресу: РК, Туркестанская область, Ордабасинский район, с/о Бадамский, село Бадам, мкр. Орда, здание 326/1.
10	Состояние объекта огнезащиты (отобранных образцов)	В результате визуального осмотра внешний вид соответствует требованиям п. 9.4.10.3 СТ РК 615-1-2011
11	Способ огнезащитной обработки, площадь обработки, условия эксплуатации	Поверхностная пропитка 383,4 м ² в соответствии с нормативно-технической документацией
12	Метод проведения испытаний	п.п. 9.4.10.4 СТ РК 615-1-2011
13	Условия проведения испытаний	Температура окружающей среды + 17°C Относительная влажность 48 %
14	Метод отбора образцов	п.п. 9.4.10.3 СТ РК 615-1-2011
15	Дата отбора образцов	13.11.2024 г.

Запрещается полная или частичная перепечатка без разрешения ТОО «ONTUSTIK KAZ-LENZ»
Протокол испытания распространяется только на образцы подвергнутые испытанию

16	Результат испытаний:		
№ п/п	Явления	Норма по НД	Фактически
	1 образец - третья стропила слева от левой стороны торца 2 образец - пятая стропила справа от левой стороны торца 3 образец - седьмая стропила слева от левой стороны торца 4 образец - девятая стропила справа от левой стороны торца		
1	изменение цвета, усадка, вспучивание, коробление, тление и др.	-	Наблюдается изменение цвета, вспучивание, тление.
2	появление признаков воспламенения (пламенное горение вне зоны воздействия пламени газовой горелки)	Не наблюдается	Не наблюдается
3	самостоятельное горение образца после отключения газовой горелки	Не наблюдается	Не наблюдается
4	сквозное прогорание образца до образования отверстия	Не наблюдается	Не наблюдается
5	обугливание образца на всю глубину в зоне воздействия пламени газовой горелки	Не наблюдается	Не наблюдается
6	полное или неполное обугливание обработанной огнезащитным средством стороны образца на площади, ограниченной рамкой зажимного устройства	Не наблюдается	Не наблюдается
17	Вывод	Результаты испытаний образцов на площади 383,4 м ² считаются положительными, так как в процессе испытаний не были зафиксированы явления указанные в п.п. 9.4.10.5 СТ РК 615 - 1 - 2011	
18	Заведующий испытательной лаборатории Испытатели:		
		Камбарбеков Р.Б. Бердишаев А.Т.	

Испытательная лаборатория ТОО "ONTUSTIK KAZ-LENZ"
АКТ №3478 отбора образцов объекта огнезащиты

	Дата отбора образцов	13 ноября 2024 года
	Должность, Ф.И.О. представителя организации проводившей огнезащитную обработку	Директор ТОО «FIRE STOP» Торекулова У. О.
	Должность, Ф.И.О. представителя объекта где проводились огнезащитные работы	Директор ТОО «Ясли-сад «Ұлы-Орда»» Татпенова А. А.
	Наименование, адрес и тип конструкции объекта огнезащиты	Деревянные конструкции кровли здания ТОО «Ясли-сад «Ұлы-Орда» расположенного по адресу; РК, Туркестанская область, Ордабасинский район, с/о Бадамский, село Бадам, мкр. Орда, здание 326/1.
	Наименование (вид) огнезащитного средства (сведения об изготовителе, товарный знак и маркировка огнезащитного средства)	«ПОС-1», 2-группа огнезащитной эффективности, СТ ДГП 39919819-01-2006, производитель: РГП на ПХВ «Институт проблем горения» г. Алматы ул. Богенбай батыра 172.
	Способ, площадь обработки, визуальный осмотр обработанного объекта и условия эксплуатации	метод поверхностной пропитки 383,4 м2 п.11 СТ РК 615-1-2011
	Место отбора образцов	
		Номер образца
1	третья стропила слева от левой стороны торца	1
2	пятая стропила справа от левой стороны торца	2
3	седьмая стропила слева от левой стороны торца	3
4	девятая стропила справа от левой стороны торца	4

Акт составлен на 1 листе, в 2 экземплярах.

Представитель объекта огнезащиты

Представитель организации проводившей огнезащитную обработку

Представитель испытательной лаборатории

Татпенова А. А.
(Ф.И.О.)

Торекулова У.О.
(Ф.И.О.)

Бердишаев А.Т.
(Ф.И.О.)



АКТ №3478 отбора образцов объекта огнезащиты

Акт составлен на 1 листе, в 2 экземплярах.

(подпись)

(Φ.Π.Ο.)

(подпись)

(Φ.Π.Ο.)

(подпись)

(Ф.И.О.)



**Акт сдачи – приемки в эксплуатацию
огнезащитной обработки объекта огнезащиты
№3478 от «14» ноября 2024 года**

1.Наименование объекта огнезащиты: Деревянные конструкции кровли здания ТОО «Ясли-сад «Ұлы-Орда».

2.Адрес объекта огнезащиты: РК, Туркестанская область, Ордабасинский район, с/о Бадамский, село Бадам, мкр. Орда, здание 326/1.

(индекс, наименование города(населенного пункта),наименование улицы(переулкa),номер дома)

3.Руководитель предприятия (объекта огнезащиты): Директор ТОО «Ясли-сад «Ұлы-Орда»» Татпенова А. А.

4.Комиссия в составе, председатель комиссии:

Директор ТОО «FIRE STOP» Торекулова У. О., Директор ТОО «Ясли-сад «Ұлы-Орда»» Татпенова А. А., специалист испытательной лаборатории Бердишаев А.Т.

(Ф,И,О,,Организация(учреждение),должность)

провели осмотр выполненных огнезащитных работ: метод поверхностной пропитки деревянных конструкции кровли здания ТОО «Ясли-сад «Ұлы-Орда» расположенного по адресу; РК, Туркестанская область, Ордабасинский район, с/о Бадамский, село Бадам, мкр. Орда, здание 326/1. (383,4 м2).

(наименование вида огнезащитных работ)

при этом установлено: огнезащитная обработка объекта огнезащиты произведена согласно требованиям СТ РК 615-1-2011, ГОСТ Р 53292-2009.

(описание выполненной работы)

5.Соответствие выполненных огнезащитных работ требованиям нормативной и (или) технической документации: СТ РК 615-1-2011, ГОСТ Р 53292-2009.

(указывается нормативная и (или) техническая документация)

6.При выполнении огнезащитных работ применялось огнезащитное средство:

«ПОС-1», 2-группа огнезащитной эффективности, СТ ДПП 39919819-01-2006,производитель:РГП на ПХВ «Институт проблем горения» г. Алматы ул. Богенбай батыра 172.

(наименование огнезащитного средства, технические и эксплуатационные характеристики)

7.Решение комиссии: огнезащитная обработка объекта огнезащиты, состояние огнезащитного покрытия соответствует всем требованиям нормативной и технической документации на огнезащитное средство, технологии нанесения огнезащитного средства соблюдены в соответствии с СТ РК 615-1-2011,ГОСТ Р 53292-2009

Акт составлен на 1 листе, в 3 экземплярах

Председатель комиссии

Торекулова У.О.

Член комиссии

Татпенова А. А.

Член комиссии

Бердишаев А.Т.



**Акт сдачи – приемки в эксплуатацию
огнезащитной обработки объекта огнезащиты
№3478 от «14» ноября 2024 года**

1.Наименование объекта огнезащиты: Деревянные конструкции кровли здания ТОО «Ясли-сад «Ұлы-Орда».

2.Адрес объекта огнезащиты: РК, Туркестанская область, Ордабасинский район, с/о Бадамский, село Бадам, мкр. Орда, здание 326/1.

(индекс, наименование города(населенного пункта),наименование улицы(переулка),номер дома)

3.Руководитель предприятия (объекта огнезащиты): Директор ТОО «Ясли-сад «Ұлы-Орда»» Татпенова А. А.

4.Комиссия в составе, председатель комиссии:

Директор ТОО «FIRE STOP» Торекулова У. О., Директор ТОО «Ясли-сад «Ұлы-Орда»» Татпенова А. А., специалист испытательной лаборатории Бердишаев А.Т.

(Ф,И,О,,Организация(учреждение),должность)

провели осмотр выполненных огнезащитных работ: метод поверхностной пропитки деревянных конструкции кровли здания ТОО «Ясли-сад «Ұлы-Орда» расположенного по адресу; РК, Туркестанская область, Ордабасинский район, с/о Бадамский, село Бадам, мкр. Орда, здание 326/1. (383,4 м2).

(наименование вида огнезащитных работ)

при этом установлено: огнезащитная обработка объекта огнезащиты произведена согласно требованиям СТ РК 615-1-2011, ГОСТ Р 53292-2009.

(описание выполненной работы)

5.Соответствие выполненных огнезащитных работ требованиям нормативной и (или) технической документации: СТ РК 615-1-2011, ГОСТ Р 53292-2009.

(указывается нормативная и (или) техническая документация)

6.При выполнении огнезащитных работ применялось огнезащитное средство:

«ПОС-1», 2-группа огнезащитной эффективности, СТ ДГП 39919819-01-2006,производитель:РГП на ПХВ «Институт проблем горения» г. Алматы ул. Богенбай батыра 172.

(наименование огнезащитного средства, технические и эксплуатационные характеристики)

7.Решение комиссии: огнезащитная обработка объекта огнезащиты, состояние огнезащитного покрытия соответствует всем требованиям нормативной и технической документации на огнезащитное средство, технологии нанесения огнезащитного средства соблюдены в соответствии с СТ РК 615-1-2011,ГОСТ Р 53292-2009

Акт составлен на 1 листе, в 3 экземплярах

Председатель комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Торекулова У.О.

Татпенова А. А.

Бердишаев А.Т.



**Акт сдачи – приемки в эксплуатацию
огнезащитной обработки объекта огнезащиты
№3478 от «14» ноября 2024 года**

1.Наименование объекта огнезащиты: Деревянные конструкции кровли здания ТОО «Ясли-сад «Ұлы-Орда».

2.Адрес объекта огнезащиты: РК, Туркестанская область, Ордабасинский район, с/о Бадамский, село Бадам, мкр. Орда, здание 326/1.
(индекс, наименование города(населенного пункта),наименование улицы(переулкa),номер дома)

3.Руководитель предприятия (объекта огнезащиты): Директор ТОО «Ясли-сад «Ұлы-Орда»» Татпенова А. А.

4.Комиссия в составе, председатель комиссии:

Директор ТОО «FIRE STOP» Торекулова У. О., Директор ТОО «Ясли-сад «Ұлы-Орда»» Татпенова А. А., специалист испытательной лаборатории Бердишаев А.Т.
(Ф,И,О,,Организация(учреждение),должность)

провели осмотр выполненных огнезащитных работ: метод поверхностной пропитки деревянных конструкции кровли здания ТОО «Ясли-сад «Ұлы-Орда» расположенного по адресу; РК, Туркестанская область, Ордабасинский район, с/о Бадамский, село Бадам, мкр. Орда, здание 326/1. (383,4 м2).
(наименование вида огнезащитных работ)

при этом установлено: огнезащитная обработка объекта огнезащиты произведена согласно требованиям СТ РК 615-1-2011, ГОСТ Р 53292-2009.
(описание выполненной работы)

5.Соответствие выполненных огнезащитных работ требованиям нормативной и (или) технической документации: СТ РК 615-1-2011, ГОСТ Р 53292-2009.
(указывается нормативная и (или) техническая документация)

6.При выполнении огнезащитных работ применялось огнезащитное средство: «ПОС-1», 2-группа огнезащитной эффективности, СТ ДГП 39919819-01-2006,производитель:РГП на ПХВ «Институт проблем горения» г. Алматы ул. Богенбай батыра 172.
(наименование огнезащитного средства, технические и эксплуатационные характеристики)

7.Решение комиссии: огнезащитная обработка объекта огнезащиты, состояние огнезащитного покрытия соответствует всем требованиям нормативной и технической документации на огнезащитное средство, технологии нанесения огнезащитного средства соблюдены в соответствии с СТ РК 615-1-2011,ГОСТ Р 53292-2009

Акт составлен на 1 листе, в 3 экземплярах

Председатель комиссии

Член комиссии

Член комиссии



Торекулова У.О.

Татпенова А. А.

Бердишаев А.Т.

Инструкция о противопожарном режиме

1. Основные понятия

1.1. Пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

1.2. Пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

1.3. Требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством РК, нормативными документами или уполномоченными государственными органами.

1.4. Нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

1.5. Противопожарный режим - требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организации и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

1.6. Пожарная охрана - совокупность созданных в установленном порядке органов управления, подразделений и организаций, предназначенных для организации профилактики пожаров, их тушения и проведения возложенных на них аварийно-спасательных работ.

1.7. Объект (предприятие) - недвижимое и движимое имущество, в отношении которого устанавливаются требования пожарной безопасности.

1.8. Меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

2. Права и обязанности сотрудников в области пожарной безопасности

2.1. Сотрудники имеют право на:

- защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара;
- возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном действующим законодательством;
- участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и имуществу;
- получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны;
- участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке в деятельности добровольной пожарной охраны.

2.2. Сотрудники обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности;
- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;
- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров; выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;
- предоставлять в порядке, установленном законодательством РК возможность должностным лицам пожарной охраны проводить обследования и проверки производственных, хозяйственных, иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.

3. Общие требования

3.1. Все сотрудники допускаются к работе только после проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума, впоследствии противопожарный инструктаж проводится не реже 2 раз в год специалистом, ответственным за пожарную безопасность.

Инструктаж проводится по знанию и соблюдению Инструкции о мерах пожарной безопасности (вводный), а последующее обучение по дополнительно разрабатываемой тематике, которая записывается в специальный журнал, где указываются сведения об инструктируемом сотруднике (Ф.И.О., должность и адрес проживания), указывается дата проведения инструктажа, кто проводит и удостоверяется подписью получившего инструктаж.

3.2. Уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность за нарушение (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от выполнения) требований пожарной безопасности, в том числе Правил противопожарного режима и Инструкции о мерах пожарной безопасности, в соответствии с действующим законодательством РК несут:

- собственники (балансодержатели) имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители и должностные лица медицинской организации и органа управления здравоохранением;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные сотрудники.

4. Основные требования пожарной безопасности

4.1. Территория, прилегающая к зданию, должна содержаться в чистоте и очищенной от горящих отходов и мусора.

4.2. На территории, прилегающей к зданию, запрещается оставлять емкости с легковоспламеняющимися, горючими жидкостями и горючими газами.

4.3. В помещениях запрещается:

- хранение и применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, взрывчатых веществ, баллонов с газами, товаров в аэрозольной упаковке, целлулоиде и других взрывопожарных веществ и материалов;
- использовать технические помещения, вентиляционные камеры и лифтовые холлы для хранения оборудования, мебели и других предметов;
- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, коридоры и запасные выходы между этажами;
- проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других ЛВЖ и ГЖ, а также производить отопгревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;
- устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;
- оставлять без присмотра компьютеры, радиоприемники, телевизоры, электронагревательные приборы и другую технику, включенную в сеть;
- курить в не отведенных для этого местах.

4.4. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений. При пребывании людей в помещении двери могут запираются лишь на внутренние легко открывающиеся запоры.

4.5. На путях эвакуации запрещается:

- хранение (в том числе временное) любого инвентаря и материалов;
- устройство порогов и других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей;
- применять на путях эвакуации горючие материалы для отделки, облицовки, окраски стен и потолков.

4.6. На случай отключения электроэнергии у обслуживающего персонала (из состава дежурной смены) должен быть фонарик (не менее 2-х).

5. Требования пожарной безопасности к электроустановкам и электроприборам

5.1. Во всех помещениях (независимо от назначения), которые по окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены (за исключением пожарной и охранной сигнализации).

5.2. Все электрооборудование, а также оборудование и механизмы, которые могут оказаться под напряжением (защитные кожуха рубильников, металлические части оборудования, ЭВМ и т.п.), должны быть заземлены.

5.3. Согласно Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей осмотр и проверка осветительной сети, а именно: испытание и измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей, а также контуров заземления электрооборудования производить 1 раз в 3 года, как и измерение нагрузок и величин напряжений в отдельных узловых и конечных точках электросети.

5.4. Электроустановки должны монтироваться и эксплуатироваться в соответствии с Правилами устройства электроустановок, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ), Правилами

техники безопасности при эксплуатации потребителями и другими нормативными документами.

5.5. При эксплуатации электроустановок и электроприборов запрещается:

- использовать электроаппараты и приборы в условиях, не соответствующих рекомендациям (инструкциям) предприятий изготовителей, или имеющие неисправности, способные привести к пожару, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной и потерявшей защитные свойства изоляцией;
- пользоваться поврежденными розетками, выключателями, рубильниками и другими электроустановочными изделиями;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками (рассеивателями);
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов и письменного разрешения на это;
- оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, компьютеры, телевизоры, радиоприемники и т.п.;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты от перегрузки и короткого замыкания;
- прикасаться и наступать на оборванные провода;
- прикасаться к открытым и оголенным токоведущим частям и электропроводам;
- ремонтировать оборудование и производить замену предохранителей и сгоревших электролампочек, находящихся под напряжением, лицам, не имеющим группу допуска по электробезопасности и дополнительно не проинструктированным по технике безопасности;
- проводить электросварочные, газосварочные и другие пожароопасные работы без соответствующего оформления наряда-допуска на выполнение работ повышенной опасности согласно Правилам противопожарного режима.

6. Общие требования

6.1. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки.

6.2. Установки охранной и пожарной автоматики должны находиться в исправном состоянии. Проверка включения, техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты) должны выполняться согласно договорам и осуществляться в соответствии с годовым планом-графиком и сроками проведения проверок и ремонтных работ.

6.3. Планы (схемы) эвакуации людей (разработанные и вывешенные на видных местах) в случае пожара отрабатывать не реже одного раза в год, а в целях обеспечения безопасной и быстрой эвакуации людей проводить

практические тренировки. Оповещение людей о пожаре при проведении тренировок проводить голосом, не допуская паники.

6.4. Помещения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями)

6.5. Огнетушители, отправляемые на перезарядку, должны заменяться соответствующим количеством заряженных огнетушителей.

7. Обязанности и действия сотрудников при пожаре

7.1. Каждый сотрудник при обнаружении пожара или признаков горения (задымлении, запаха гари, повышении температуры и т.п.), а также при срабатывании пожарной сигнализации обязан:

- немедленно сообщить об этом по телефону "101" в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);
- оповестить о возгорании дежурную службу административного здания, начальника структурного подразделения;
- принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

7.2. Должностные лица, прибывшие к месту пожара, обязаны:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану;
- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
- организовать спасение людей с использованием для этого имеющиеся силы и средства;
- при необходимости отключить электроэнергию (выключив вводные рубильники), выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений зданий (нельзя бить стекла на окнах и держать открытыми двери);
- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
- осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;
- обеспечить соблюдение требований безопасности сотрудниками, принимающими участие в тушении пожара;
- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
- организовать встречу подразделений пожарной охраны и проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях объекта и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

8. Правила применения средств пожаротушения

При возникновении пожара сотрудник, обнаруживший очаг возгорания, обязан использовать:

8.1. Ручной огнетушитель ОП-5:

- доставить огнетушитель к месту пожара;
- сорвать пломбу и выдернуть чеку;
- направить сопло на очаг пожара и нажать на рычаг;
- начинать тушить с основания, в нишах тушить сверху;
- после завершения тушения убедиться в невозможности возобновления горения.

8.2. Пожарный кран:

- открыть дверку пожарного шкафа;
- раскатать пожарный рукав по длине, взять в руки пожарный ствол и открыть вентиль, направить струю воды на очаг пожара.

Категорически запрещается тушить водой возгорание находящихся под напряжением электроустановок, электроприборов и электропроводку.

ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙ КЕЗІНДЕ ЭВАКУАЦИЯ ЖОСПАРЫ




"BEKITEMIH"

Түркістан облысы адамн әлеуеті
дамьту баскармасының

Ортабасы ауданының адами әлеуеті
дамыту бөлімінің "Ұлы Орта" ЖШС басқару
бөлімшесінің меңгерушісі

Тетянова О. А.

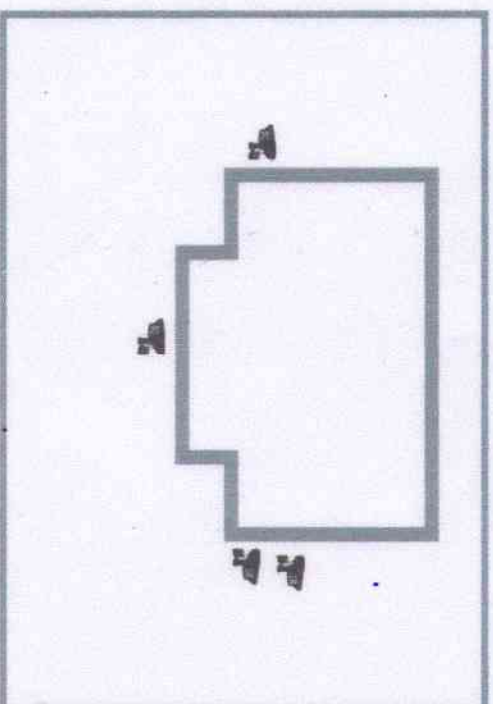

ӨРТ КАҢИПСІЗДІГІНЕ ЖАУАПТЫ ТҮНГА

Шаруашылық меңгерушісі Б.Бекмолд Кудирова Г.К.

Назар аударыңыздар
Өрт кезінде 101 нөмеріне
хабарласыңыз

Өрт кезіндегі өпекот.

Тыныштық сақтаңыз

Transportation 101
Monopine round-trip many
- Expect an average of 100
- Estimate 100-150

2 Адамдарды
эпохалары

3 Мышечные спазмы
вспрыскиваются
вместе с адреналином

Өрт кезіндегі өлекс.

Тыныштық сақтаңыз

телефонном 101
номерные координаты шалы

2. **Эти омары почти
окумарны**

3. Атамадагы маанилүү сөздөр

- Кыргызстандын географиясы
- Маданияттын өнүгүшү
- Экономикасы
- Медия/информация

Chapters

Checkpoints

...the same way as the ...

[illegible]

1800-222-2345

Optimizing...

Optic chiasm

...and the ...

Therapeutic outcome

Specialized group

Richard Ryland

Microtus pennsylvanicus

Investigative studies

ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙ КЕЗІНДЕ ЭВАКУАЦИЯ ЖОСПАРЫ

2-қабат



Түркістан облысы админ алуатті
дамьтту басқармасының
Ордабасы ауданының админ алуатті
дамьтту бөлімінің "Ұлы Орта" ЖШС бөбекжай
бағабасының мөңгерушісі

Төтенова Ә. А.

Өрт қауіпсіздігіне жауапты тұлға
Шаруашылық мөңгерушісі Төтенова Ә. А. Кудиярова Г. К.

Назар аударыңыздар
Өрт кезінде 101 нөмеріне
хабарласыңыз

1. Жоспар бойынша бағдарлау
2. Өздеріңіздің тұрғылықты жеріңізді анықтаңыз
3. Өрт кезінде инструкция бойынша әрекет етіңіз

Өрт кезіндегі әрекет.	
Тыныштық сақтаңыз!	
1. Төтенше 101 нөмеріне қоңырау шалу	- Нұсқа мөңгө-салы - Өрт шыққан жер - Өздеріңіз тегісі
2. Адамдарды эвакуациялау	- Қосалшы белгісі - Бөлменің бағдарлау арты - Өрт шыққан жер
3. Мүгедектілерге арты әрекет іс-шараларды жүзеге асыру	- Өрт шыққан жер - Өрт шыққан жер - Өрт шыққан жер

Өрт кезіндегі әрекет.	
Тыныштық сақтаңыз!	
1. Төтенше 101 нөмеріне қоңырау шалу	- Нұсқа мөңгө-салы - Өрт шыққан жер - Өздеріңіз тегісі
2. Өрт ошақтарын оқшаулау	- Өрт шыққан жер - Өрт шыққан жер - Өрт шыққан жер
3. Адамдарды эвакуациялау	- Өрт шыққан жер - Өрт шыққан жер - Өрт шыққан жер

Өрт кезіндегі әрекет.	
Тыныштық сақтаңыз!	
1. Төтенше 101 нөмеріне қоңырау шалу	- Нұсқа мөңгө-салы - Өрт шыққан жер - Өздеріңіз тегісі
2. Өрт ошақтарын оқшаулау	- Өрт шыққан жер - Өрт шыққан жер - Өрт шыққан жер
3. Адамдарды эвакуациялау	- Өрт шыққан жер - Өрт шыққан жер - Өрт шыққан жер
